


Osvědčení o řádném a odborném provedení stavebních prací

Název realizace:	Mateřská škola Slivenec
Cena díla:	599.068,- Kč bez DPH
Doba realizace:	1 - 3/2013 – 45 pracovních dnů
Zhotovitel:	CIUR, a.s., Malé náměstí 142/3, 111 21 Praha 1
Zadavatel:	Městská část Praha 5 - Slivenec, generální dodavatel – INGBAU s.r.o.
Kontaktní osoba zadavatele:	Hlavní stavbyvedoucí p.Pabišta, Mob. 724 122 727
Manažer zakázky za CIUR:	p.Petr Čamra – vedoucí střediska aplikací
Stavbyvedoucí CIUR:	p.Jiří Tejkal
Popis předmětu plnění:	Zateplení střešní konstrukce a obvodových stěn foukanou celulóзовou izolací Climatizer Plus vč. aplikace tepelné izolace do předstěn formou nástřiku. Objem foukané izolace v obvodových stěnách 162 m ³ izolace tj. 492 m ² plochy, ve střešní konstrukci 206 m ³ izolace tj. 546 m ² plochy střešní dutiny a 49 m ³ nástřiku izolace tj. 959 m ² plochy předstěn.

Fotografie:

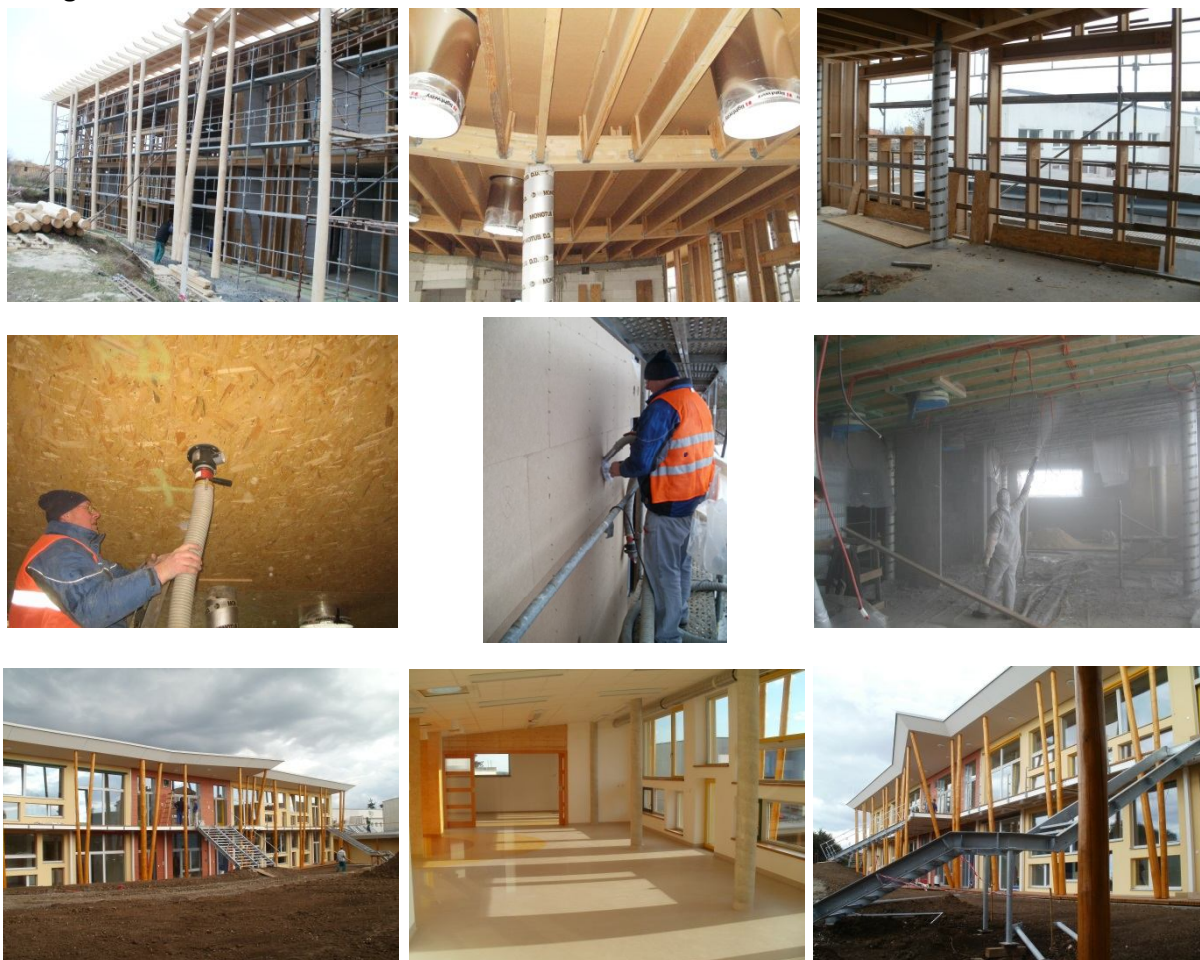

Průběh výstavby: Stavební práce probíhaly podle harmonogramu.

Potvrzujeme, že veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Tato reference se vystavuje na žádost společnosti CIUR a.s. pro účel výběrových řízení do obchodních soutěží. Objednatel potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
